

## MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 16-04-2026 14:55  
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0004091 Fol:0 Anex:1 FA:0  
ORIGEN 110. OFICINA DE CONTROL INTERNO / OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ  
DESTINO 100. DESPACHO DEL MINISTRO / PATRICIA DUQUE CRUZ  
ASUNTO INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO CGR - CORTE 31 DE MARZO DE OBS

2026IE0004091



**PARA: PATRICIA DUQUE CRUZ**  
Ministra del Deporte

**DE: 110.-DESPACHO DEL MINISTRO/OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**ASUNTO:** Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR – Corte 31 de Marzo de 2026

Atento Saludo Señora Ministra.

La Oficina de Control Interno en virtud de las atribuciones legales otorgadas por la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Nacional 403 de 2020, el rol de Seguimiento y Evaluación que le corresponde de conformidad al Decreto Nacional 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9 literal k) y en cumplimiento de lo establecido en la Directiva Presidencial No. 03 de 2012, Circular No.15 del 30 de septiembre de 2020 de la CGR – *Lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas* y Resolución Orgánica CGR No. 073 de 2026, *Por la cual se subroga la resolución reglamentaria Orgánica 066 del 2024, que reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes, otra información y planes de mejoramiento que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)*, remite para su conocimiento y fines que estime “Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR – Corte 30 de Marzo de 2026”.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Dando cumplimiento a lo señalado en el Decreto Nacional No. 648 de 2017 – Artículo 16, Parágrafo 1, se remite para conocimiento de los miembros integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, copia del presente informe de seguimiento en cumplimiento de requerimientos normativos.

Cordialmente,


Firmado electrónicamente por:  
OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ (osmartinez)  
Jefe De Oficina De Control Interno  
16-04-2026 14:55  
3574ecc04dbc04831672dfa988230902



Anexos: Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR – Corte 31 de Marzo de 2026

Copia: Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI)

Elaboró: Oscar Alfredo Martinez Rodriguez - Jefe Oficina de Control Interno

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                             | <b>Versión: 1</b>           |
|   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|   | <b>FORMATO</b>                             | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |
| INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO  |  |                             |

## 1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

**Tipo de Informe:** Final

**Denominación del Trabajo:** Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR – Corte 31 de marzo de 2026

**Objetivo(s):** Realizar evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR).

**Alcance:** Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR – Corte 31 de marzo de 2026.

### Marco Normativo:

- Directiva Presidencial No. 03 de 2012
- Circular No.15 del 30 de septiembre de 2020 de la CGR – Lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas.
- Resolución Orgánica CGR No. 073 de 2026 – Por la cual se subroga la resolución reglamentaria Orgánica 066 del 2024, que reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes, otra información y planes de mejoramiento que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI).

**Limitantes:** Para este periodo no se reporta limitantes para la elaboración del presente informe


## 2. METODOLOGÍA:

2.1 Conformación, resultados, seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento CGR a 31 de marzo de 2026:

A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación, efectuado por la oficina de control interno, a los planes de mejoramiento con corte al 31 de marzo 2026.

Tabla No. 1 Distribución hallazgos por vigencia, cumplidos, en ejecución y vencidos

| Vigencia  | Total Hallazgos | Hallazgos Cumplidos | Hallazgos en ejecución | Hallazgos en ejecución vencidos |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|
| 2012-2015 | 129             | 129                 | 0                      | 0                               |
| 2016      | 58              | 58                  | 0                      | 0                               |
| 2019      | 259             | 246                 | 13                     | 0                               |
| 2020      | 13              | 10                  | 3                      | 0                               |

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                             | <b>Versión: 1</b>           |
|   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|   | <b>FORMATO</b>                             | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |
| INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO  |  |                             |

| Vigencia     | Total Hallazgos | Hallazgos Cumplidos | Hallazgos en ejecución | Hallazgos en ejecución vencidos |
|--------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|
| 2022         | 23              | 17                  | 6                      | 0                               |
| 2023         | 20              | 13                  | 7                      | 0                               |
| 2024         | 26              | 19                  | 7                      | 2                               |
| 2025         | 15              | 13                  | 2                      | 0                               |
| 2026         | 3               | 0                   | 3                      | 0                               |
| <b>TOTAL</b> | <b>546</b>      | <b>505</b>          | <b><u>41</u></b>       | <b>2</b>                        |

Fuente: Base de datos OCI E Isolucion – Corte 31/03/2026

Durante el mes de marzo, no obtuvieron evidencias de la culminación o cumplimiento de las actividades establecidas por el proceso de Fomento al desarrollo Humano y Social, para subsanar los hallazgos 1508/2024 y 1516/2024. Con radicado No. 2026IE0001797 y asunto: subsanación y remisión de insumo plan de mejoramiento hallazgo 1516 Enterritorio, el proceso solicita la modificación de tareas y cierre del hallazgo, para lo cual la Oficina de Control Interno responde con Radicado No. 2026IE0003319, en el cual se cita:

*Recomendaciones:*

- Realizar el respectivo cargue de información en el Sistema de Gestión Isolución de las evidencias correspondiente a cada actividad.
- Comunicar a la Oficina de Control Interno cuando el hallazgo se encuentre debidamente gestionado en sus actividades, solicitando la verificación y cierre

De lo cual a la fecha de presentación de este informe, no se ha recibido solicitud de verificación del Plan de mejora en referencia.

Tabla No. 2 Distribución hallazgos en ejecución por proceso y vigencia.


| PROCESO   | VIGENCIA  |          |          |          |          |          |          | Total            |
|---|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
|   | 2019      | 2020     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |                  |
| Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica | 10        | 1        | 6        | 7        | 4        | 2        | 3        | 33               |
| Adquisición de Bienes y Servicios               | 3         | 2        |          |          | 1        |          |          | 6                |
| Fomento al Desarrollo Humano y Social           |           |          |          |          | 2        |          |          | 2                |
| <b>Total</b>                                    | <b>13</b> | <b>3</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b><u>41</u></b> |


Fuente: Base de datos OCI e Isolucion – Corte 31/03/2026

Tabla No. 3 Distribución Total hallazgos, abiertos, cerrados y % de avance

|                        | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total                |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| <b>Total Hallazgos</b> | 259  | 13   | 23   | 20   | 26   | 15   | 3    | 546                  |
| <b>Abiertos</b>        | 13   | 3    | 6    | 7    | 7    | 2    | 3    | <b><u>41</u></b>     |
| <b>Cerrados</b>        | 246  | 10   | 17   | 13   | 19   | 13   | 0    | 505                  |
| <b>% de Avance</b>     | 95%  | 77%  | 74%  | 65%  | 73%  | 87%  | 0%   | <b><u>92,49%</u></b> |

Fuente: Base de datos OCI e Isolucion – Corte 31/03/2026

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                             | <b>Versión: 1</b>           |
|   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|   | <b>FORMATO</b>                             | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |
| INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO  |  |                             |

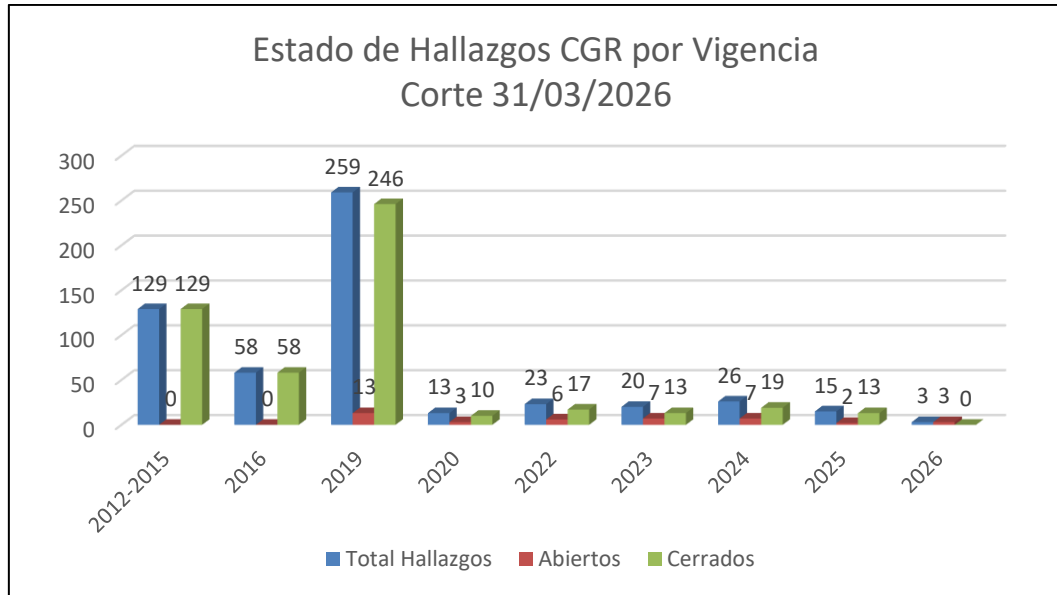

Fuente: Base de datos OCI e Isolucion- Corte 31/03/2026

Tabla No. 4 Hallazgos cerrados durante el periodo


Durante el mes de marzo se presentó el cierre de seis (6) planes de mejoramiento, de los cuales corresponden cinco (5) al proceso de Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica y uno (1) al proceso de Gestion Jurídica.

A continuación, se presenta la relación de los seis (6) PM cerrados, la descripción del hallazgo y radicado con el cual se emitió el respectivo concepto por parte de la OCI:

| # | CÓDIGO HALLAZGO | vigencia de suscripción | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO   | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO   | Radicado Concepto de Cierre |
|---|-----------------|-------------------------|------------------|---|--|-----------------------------|
| 1 | H-165           | 2019                    | 850              | Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica | H-165. Incumplimiento de los deberes contractuales derivados de la suscripción del convenio 337 del 26/06/2014 (D): Se liquidó unilateralmente el Convenio mediante Resol 1752/2017. De conformidad con lo indicado, se tiene que, los inconvenientes judiciales que se han presentado por desconocimiento de la norma por parte de los supervisores tanto de convenio como de contrato. | 2026IE0002254               |

|                                  |  |                             |
|----------------------------------|--|-----------------------------|
|                                  | <b>PROCESO</b>                             | <b>Versión: 1</b>           |
|                                  | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|                                  | <b>FORMATO</b>                             | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |
| INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO |  |                             |

| # | CÓDIGO HALLAZGO | vigencia de suscripción | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO   | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO   | Radicado Concepto de Cierre |
|---|-----------------|-------------------------|------------------|---|--|-----------------------------|
| 2 | H-170           | 2019                    | 855              | Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica | H-170. Pagos a la seguridad social en salud y pensión. (D-OI). En la revisión efectuada a los contratos de obra derivados de los convenios suscritos con los <municipios de Chinácota, Pamplonita, Puerto Santander, y Gramalote, se evidencio el pago de los apostes al SGSSS por debajo de lo ordenado en la normatividad vigente.   | 2026IE0002254               |
| 3 | H-11-2024       | 2024                    | 1523             | Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica | Hallazgo No. 11. Pago de obra no ejecutada, escenario recreo deportivo cancha futbol 11. Mahates, Bolívar. En el contrato 466 de 2023 por \$3.473.536.709 suscrito por el IDER para Obras de Mantenimiento y Mejoramiento de Escenarios Deportivos, se suscribió acta con saldos pendientes por terminar por \$173.676.835, con fecha final de entrega el 15 de enero de 2024  | 2026IE0002254               |
| 4 | H-13-2024       | 2024                    | 1513             | Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica | Hallazgo 13. Viabilidad y planeación de convenios interadministrativos para infraestructura deportiva. Luego de la revisión documental y en sitio de las obras derivadas de los convenios interadministrativos para el desarrollo de infraestructura deportiva en diferentes territorios, evidencia debilidad en el proceso de viabilidad técnica, financiera y administrativa | 2026IE0002928               |
| 5 | H-24-2024       | 2024                    | 1519             | Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica | H 24. Planeación, Calidad y Funcionalidad Convenio COID-1223 2021. Complejo Deportivo Rafael J. Mejía del Municipio de Támeis (IP). En el contrato SPDT-SA-MC-006 2022, derivado del convenio COID-1223-   | 2026IE0002928               |

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                             | <b>Versión: 1</b>           |
|   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|   | <b>FORMATO</b>                             | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |
| INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO  |  |                             |

| # | CÓDIGO HALLAZGO | vigencia de suscripción | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO          | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO   | Radicado Concepto de Cierre |
|---|-----------------|-------------------------|------------------|------------------|--|-----------------------------|
|   |                 |                         |                  |                  | 2021 se identificaron deficiencias de planeación, funcionalidad y calidad en las obras de construcción, adecuación y remodelación del Complejo Polideportivo Rafael J. Mejía del Municipio de Támesis-Antioquia. |                             |
| 6 | AF-H2-25        | 2025                    | 276              | Gestion Jurídica | Hallazgo 2. Diferencias entre los soportes y el saldo de la cuenta 2514 - Beneficios posempleo   | 2026IE0003737               |

Fuente: Construcción Oficina de Control Interno – Aplicativo GESDOC

Conforme a lo anteriormente expuesto, a corte 31 de marzo se presenta un cumplimiento en los planes de mejoramiento del **99,60%**, con un avance del **92,49%** conforme a lo consultado y verificado en la Herramienta Isolucion y la Base de datos de la OCl.

| % Cumplimiento | % Avance |
|----------------|----------|
| 99,60%         | 91,39%   |


Para el mes de abril del 2026, se tiene programado el cierre de tres (3) PM, los cuales corresponden al proceso de Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica: 284/2025, 285/2026 y 286/2026.

### 3. RESULTADOS:


A continuación, se relacionan los hallazgos que se encuentran en ejecución por vigencia, su estado y responsable del mismo, junto con su incidencia establecida por el ente de control:

#### VIGENCIA 2019 (13)


| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  |
|---|-----------------|------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|
| 1 | H-19            | 705              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 31/07/2026                         | Disciplinario      | H-19. Mantenimiento de la Infraestructura Deportiva (D): Convenio N° 843/2013 - Contrato de Obra N° 15/2014: "Adecuación y Reconstrucción del Polideportivo Villa Olímpica del municipio de Sabanalarga - Departamento del Atlántico-", se evidencio falta de Mantenimiento a la Infraestructura deportiva. |

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                             | <b>Versión: 1</b>           |
|   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|   | <b>FORMATO</b>                             | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |
| INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO  |  |                             |


| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                        | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  |
|---|-----------------|------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 2 | H-29            | 715              | Adquisición de Bienes y Servicios             | 1/11/2019                     | 30/06/2026                         | Administrativa<br>Disciplinario           | H-29. Revisado el Portal SECOP, se evidenció que las administraciones Municipales de Córdoba, El Guamo, Magangué, Margarita, San Estanislao, San Ferdo, San Juan Nepomuceno, Soplaviento, Turbaco, Villanueva, Inder Cartagena y la Gob. Bolívar solo realizaron la publicación del proceso en algunos documentos quedando pendientes de publicar algunas etapas especialmente la post contractual.       |
| 3 | H-88            | 773              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 31/07/2026                         | Administrativa<br>Disciplinario           | H-88. Publicación en el SECOP, contrato de interventoría N° 210/2018. Condoto: Se debe tener en cuenta la Circular N° 1/2013, suscrita por Colombia Compra Eficiente. Se observa que COLDEPORTES omitió la publicación del contrato de interventoría N° 210/2018, ya que no publicó en el SECOP, ninguno de los documentos del proceso de contratación.   |
| 4 | H-92            | 777              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 31/07/2026                         | Administrativa<br>Disciplinario<br>Fiscal | H-92. Reintegro recursos no ejecutados. Se observó que el Conv N° 427/2015, fue suscrito por \$3.769.198.781, cifra esta que fue girada en su totalidad a la cuenta N° 578-542482 del Banco Bogotá y la Gob. del Chocó suscribió contratos para la ejecución del convenio por \$3.768.720.637, presentándose una diferencia de \$478.144 que no han sido reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional. |
| 5 | H-134           | 819              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 31/07/2026                         | Administrativa<br>Disciplinario<br>Fiscal | H-134. Cantidades de obra del contrato N° 205-2013 - La Calera (D, F). La CGR, en compañía de un funcionario de la Secretaría de Obras del Mpio realizó verificación de las cantidades ejecutadas por el contratista, se evidenciaron diferencias que se traducen en obra no ejecutada, pero si cancelada al contratista de obra: por valor de \$41,513,449,58  |

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                             | <b>Versión: 1</b>           |
|   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|   | <b>FORMATO</b>                             | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |
| <b>INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO</b>   |  |                             |

| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  |
|---|-----------------|------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 6 | H-143           | 828              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 31/07/2026                         | Administrativa Disciplinario        | H-143. Ejecución Contrato Obra N° 123 de 2018 derivado Convenio Interadministrativo 977 de 2017 - Municipio de Tocaima (D). La CGR realizó visita fiscal al Mpio de Tocaima el 23/04/2019, donde se evidenció que en el sitio donde se desarrollará la obra no ha habido intervención y el contrato se encontraba suspendido hace 11 meses. Conv. suscrito el 3/11/2017, por \$1.729.160.755.       |
| 7 | H-150           | 835              | Adquisición de Bienes y Servicios             | 1/11/2019                     | 30/06/2026                         | Administrativa Disciplinario Fiscal | H-150. Liquidación de Conv (F,D) El plazo de 30 meses para liquidar el convenio feneció el día 20/09/2018, sin que se hubiese realizado la liquidación administrativa o judicial, como bien lo reconoció COLDEPORTES en la comunic. 2018EE0021754. En cumplimiento de la obligación que le asiste a la Entidad se determinó saldo a favor de COLDEPORTES por \$66.264.003,45 Conv 674/2014.         |
| 8 | H-169           | 854              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 31/07/2026                         | Administrativa Disciplinario Fiscal | H-169. Estabilidad del estadio Mpal (D,F). Se concluye que la estructura norte de las graderías presenta asentamientos por encima de los límites establecidos por la norma colombiana de construcciones sismorresistentes además que se evidencia el colapso de elementos no estructurales y se ha contabilizado en acta final obras no ejecutadas; y por ello se eleva a faltante \$154.834.702.   |
| 9 | H-185           | 870              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 31/07/2026                         | Administrativa Disciplinario        | H-185. Gradería Cancha Gaitán mpio de Quimbaya Contr. 004-2018-Conv. 1331-2017 (D). En la visita de obra se evidenciaron deficiencias constructivas y defectos estructurales y de calidad en la estructura de concreto de las graderías del escenario, hormigueros, falta de recubrimiento mínimo en concreto vigas de la gradería e incorrecta conformación del confinamiento de vigas y columnas. |


|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                             | <b>Versión: 1</b>           |
|   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|   | <b>FORMATO</b>                             | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |
| INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO  |  |                             |

| #  | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO   |
|----|-----------------|------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 10 | H-203           | 888              | Adquisición de Bienes y Servicios             | 1/11/2019                     | 30/06/2026.                        | Administrativa                      | H- 203. Saldo cta. bancaria Conv. 726/2014, Barrancabermeja-Stander (A): El mpio abrió la cta. bancaria, Coldeportes desembolso a dicha cta. para los contrs. 1719-15 obra y 1724-15 intervent. y cuya ejecución financiera generó un saldo a favor de del mpio. De dicho saldo le corresponde a Coldeportes \$41.963.930,86. Se evidencia un valor mayor \$77.248.318,79 en el saldo de la Cta. Banc. |
| 11 | H-226           | 911              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 31/07/2026                         | Administrativa Disciplinario        | H-226. Publicidad y registro en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP. (D). Los municipios de Lérica, Alvarado, Ibagué, Líbano, y Purificación suscribieron convenios con Coldeportes, verificada la información de los Contratos derivados se evidencia que no se realizó la publicación de toda la documentación requerida y alguna se publicó de forma extemporánea.               |
| 12 | H-230           | 915              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 31/07/2026                         | Administrativa Disciplinario        | H-230. Public. y registro en SECOP (D). Los mpios Dolores, Prado, Ataco, Anzoátegui, Casabianca, Coello, Coyaima, Cunday, El Espinal, El Guamo, Herveo, Murillo, Palocabildo, Rovira, Saldaña, San Antonio, San Luis, Venadillo, suscribieron conv. con Coldeportes, verificada la inf. de los Contr. deriv. se evidencia que no se publicó toda la documentación requerida y alguna forma extemp.     |
| 13 | H-255           | 940              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/11/2019                     | 31/07/2026                         | Administrativa Disciplinario Fiscal | H-255. Instalación domo cubierta tarima plazuela-Mpio Alcalá (D,F): En visita realizada por la CGR a las obras del conv. 692/2014, cont. derivado CO201504002/2015 y en revisión del acta final del 28/12/2015, se evidenció el pago del ítem NP19 "construc. domo (cubierta escalera)", el cual no se instaló de manera completa dejando un sector de las escaleras al descubierto,                   |

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                             | <b>Versión: 1</b>           |
|   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|   | <b>FORMATO</b>                             | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |
| INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO  |  |                             |


### VIGENCIA 2020 (3)

| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                                       | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO   |
|---|-----------------|------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 1 | H-02-JN         | 1073             | Adquisición de Bienes y Servicios             | 15/01/2021                    | 30/06/2026.                        | Administrativa   | H-2. Liquidación Conv. Inter.(A). Revisados los conv.Nº 19, 20, 21, 22, 154, 271, 272 y 273/19, para obras XXI Juegos Nacionales y V Paralímpicos Bolívar 2019, derivados del Conv. Inter. Marco Nº 15-19, suscritos entre Coldeportes (Mindeporte) y el Depto de Bolívar, a la fecha no se han liquidado y las obras ya fueron ejecutadas y entregadas. Hay mora en los últimos giros al Depto.         |
| 2 | H-03-JN         | 1074             | Adquisición de Bienes y Servicios             | 15/01/2021                    | 30/06/2026                         | Administrativa   | H-3. Liquidación Conv. Inter. Revisados los conv.Nº 19, 20, 21, 22, 154, 271, 272 y 273/19, para obras XXI Juegos Nacionales y V Paralímpicos Bolívar 2019, derivados del Conv. Inter. Marco Nº 15-19, suscritos entre Coldeportes (Mindeporte) y el Depto de Bolívar, El Depto a la fecha, no ha liquidado las obras ejecutadas y entregadas. Existe mora injustificada en pagos a los contratistas.    |
| 3 | H-04-JN         | 1075             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 15/01/2021                    | 31/07/2026                         | Administrativa<br>Disciplinario<br>Indagación preliminar | H-4. Rend. financieros y reintegros al Tesoro Nacional, conv. para XXI Juegos Nac. y V Parana. (D, IP).<br>1. Conv.22, 19, 154 y 272-19: Se evidenció la existencia de saldos en las cuentas bancarias, que no corresponden a la diferencia entre lo girado por el Ministerio y lo pagado por el Depto, no existen conciliaciones bancarias, no se registraron todos los pagos realizados a contratistas |

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                             | <b>Versión: 1</b>           |
|   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|   | <b>FORMATO</b>                             | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |
| INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO  |  |                             |

### VIGENCIA 2022 (6)


| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDAD ES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO   |
|---|-----------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | AF-H2-2022      | 264              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/01/2023                      | 31/07/2026                         | Administrativa Disciplinario        | H-2. Doc. Contractuales Plataforma SECOP (D). Ausencia de soportes documentales en SECOP, que dan cuenta de la ejecución de los contratos y/o convenios celebrados por Mindeporte, situación contraria a lo indicado en los Dec. 1081 y 1082 de 2015. Revisada la información suministrada por Mindeporte, se evidencia ausencia de documentación en la etapa de ejecución publicado en SECOP.       |
| 2 | AF-H4-2022      | 266              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 1/01/2023                      | 31/07/2026                         | Administrativa Disciplinario        | H-4 Pérdida de competencia para liquidación de contratos (D). Se evidenció que 24 contratos que no han sido liquidados de acuerdo con lo establecido en el art. 11 de la Ley 1150 de 2011, presentándose pérdida de competencia por parte de Mindeporte para liquidarlos. En la información entregada, se observaron 96 contratos Vig. del 2012 al 2018, con "Pérdida de competencia para liquidar". |
| 3 | H-2-2022        | 1263             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 18/07/2022                     | 31/07/2026                         | Administrativa Disciplinario Fiscal | H-2. Valores pagados en contrato interadministrativo 381 de 2017 vs. ejecución de obra (D - F). Se evidencia en la documentación y los respectivos soportes, mayores valores pagados en 22 escenarios deportivos por INDEPORTES a VIVA, a los realmente ejecutados en los contratos de obra de los diferentes proveedores contratados por VIVA, en un valor de \$3.985.918.023.                      |
| 4 | H-3-2022        | 1264             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 18/07/2022                     | 31/07/2026                         | Administrativa Disciplinario        | H-3. Actividades de seguimiento, supervisión e interventoría (A - D). Múltiples inconsistencias documentales, contractuales y financieras en cada uno de los documentos presentados por las entidades, bajo un mismo objeto contractual.   |
| 5 | H-5-2022        | 1266             | Apoyo en Infraestructura                      | 18/07/2022                     | 31/07/2026                         | Administrativa OI Disciplinario     | H-5. Sistemas de información, documentación y archivo (A-D-OI). En los municipios de   |

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                             | <b>Versión: 1</b>           |
|   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|   | <b>FORMATO</b>                             | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |
| INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO  |  |                             |


| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA           | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  |
|---|-----------------|------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|
|   |                 |                  | Técnica y Científica                          |                               |                                    |                              | Nechí, Entrerriós y Angelópolis, no reposan los manuales de mantenimiento ni el acta de reunión de socialización de los manuales, el acta de entrega del escenario deportivo a los alcaldes y las secretarías responsables.   |
| 6 | H-7-2022        | 1268             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 18/07/2022                    | 31/07/2026                         | Administrativa Disciplinario | H-7. Deterioro y funcionamiento de equipos en el escenario deportivo 20 de enero del municipio de Nechí (A-D). Se evidencia deterioro, no funcionamiento, daño y pérdida de elementos entregados y que hoy para la comunidad no presta un servicio o lo hace de manera parcial. |

### VIGENCIA 2023 (7)

| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA           | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO   |
|---|-----------------|------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | H-28-2023       | 1408             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 15/08/2023                    | 31/07/2026                         | Administrativa Disciplinario | HALLAZGO N° 28. Obras físicas sin iniciar por ajustes requeridos en diseños y recursos adicionales para cierre financiero del Convenio COID-1076-2021 y Contrato de obra 362 de 2021. Apartadó.(D) En desarrollo del convenio 1076-2021 y contrato de interventoría 3-1-102452-COI-1364-01, se realizó la revisión de estudios y diseños realizándose varias observaciones a ser subsanadas. |
| 2 | H-4-2023        | 1414             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 11/08/2023                    | 31/07/2026                         | Administrativa               | H-4 Saldos por utilizar de reservas constituidas al cierre de 2021, El hallazgo se relaciona con debilidades de seguimiento y control de los supervisores de contratos y convenios, sobre la ejecución de las reservas presupuestales constituidas al cierre de 2021.  |

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                             | <b>Versión: 1</b>           |
|   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|   | <b>FORMATO</b>                             | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |
|   | INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO           |                             |


| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA    | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO   |
|---|-----------------|------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| 3 | H-5-2023        | 1415             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 11/08/2023                    | 31/07/2026                         | Indagación Preliminar | H-5 Convenio Interadministrativo No. 1259-2021 y contrato de obra No. 70678-OC-001-2022 Municipio San Benito de Abad (IP), incumplimiento de la cláusula 8.1 del convenio interadministrativo No. 1259 de 2021, correspondiente a las obligaciones a cargo del Ente Ejecutor, puntualmente en el recibo y manejo de los recursos desembolsados por el Ministerio del Deporte.  |
| 4 | H-9-2023        | 1419             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 11/08/2023                    | 31/07/2026                         | Disciplinario         | H-9 Traslado Oportuno de Rendimientos financieros a la Nación (D), se detectaron debilidades en el ejercicio de la supervisión contractual, relacionada con la exigencia del cumplimiento de la obligación relacionada con el reintegro oportuno de los rendimientos financieros generados en algunos convenios interadministrativos suscritos por el Ministerio.  |
| 5 | H-11-2023       | 1420             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 11/08/2023                    | 31/07/2026                         | Disciplinario         | H-11 Contrato de consultoría No. 1250 de 2020. Interventoría de Obra Coliseo Mayor de Ibagué (D) Al analizar la ejecución del contrato de consultoría No. 1250 de 2020 cuyo objeto es la interventoría de Obra del Coliseo Mayor de Ibagué, se evidenció que el Ministerio del Deporte, realizó pagos por concepto de costos variables que excedieron el porcentaje establecido en la forma de pago que correspondía hasta el 60% del valor total del contrato, sujeto al avance de obra. Situación observada para los pagos séptimo y octavo realizados en 2021 y para el pago noveno realizado en la vigencia 2022. Sin embargo, la entidad argumentó que, con los pagos posteriores, realizó los ajustes para normalizar las condiciones establecidas en el contrato para los costos variables. |
| 6 | H-24-2023       | 1470             | Apoyo en Infraestructura                      | 22/01/2024                    | 31/07/2026                         | Disciplinario Fiscal  | H-24-AC-FUSAGASUGA-MOSQUERA: Diferencias en precios unitarios del contrato   |

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                             | <b>Versión: 1</b>           |
|   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|   | <b>FORMATO</b>                             | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |
| INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO  |  |                             |


| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA           | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO   |
|---|-----------------|------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
|   |                 |                  | ra Técnica y Científica                       |                               |                                    |                              | 1-2022 construcción Velódromo. Mpio Mosquera (D, F). En el presupuesto oficial del contrato 1-2022 se incluyeron precios unitarios diferentes para actividades iguales, generando detrimento al patrimonio público por \$551.768.058. Actividades iguales constatadas a nivel de especificaciones y análisis de precios.   |
| 7 | H-25-2023       | 1471             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 22/01/2024                    | 31/07/2026                         | Administrativo Disciplinario | H-25-AC-FUSAGASUGA-MOSQUERA: Placas entre piso concreto contrato 1-22 construcción velódromo Mpio Mosquera (D). En el contrato 1-22 construcción Velódromo, se evidenció cambio de la especificación de la resistencia del concreto de placas de entre piso graderías. La modificación, afectó lo autorizado en la licencia de construcción y no fue informado oportunamente a la entidad encargada. |

### VIGENCIA 2024 (7)

| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  |
|---|-----------------|------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | H-12-2024       | 1500             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 30/07/2024                    | 31/07/2026                         | Disciplinario Penal Fiscal OI       | Contrato No. 100 de 2021 - Uso del suelo predio Complejo Deportivo sector de La Meseta del municipio de Girón (D-P-F-OI) Practicada la visita a la obra en ejecución del Contrato No. 100 de 2021 en el municipio de Girón se evidenció que, el predio donde se viene adelantando el proyecto de inversión pública, no cumple los requisitos legales esenciales |
| 2 | H-5-2024        | 1505             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 29/07/2024                    | 31/07/2026                         | Administrativo Disciplinario Fiscal | Hallazgo 5. Calidad de la obra derivada del convenio interadministrativo 1329 de 2017, Municipio de Villeta, Cundinamarca (D, F). Se evidenció el pago de obra, en el marco del convenio interadministrativo 1329 de  |

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                             | <b>Versión: 1</b>           |
|   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|   | <b>FORMATO</b>                             | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |
| INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO  |  |                             |


| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                   | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  |
|---|-----------------|------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
|   |                 |                  |   |                               |                                    |                                      | 2017, con daños prematuros, atribuibles a falencias en los procesos constructivos implementados por el contratista de obra en el Patinódromo construido en el Mopio de Villeta  |
| 3 | H-8-2024        | 1508             | Fomento al Desarrollo Humano y Social         | 29/07/2024                    | 31/03/2026                         | Administrativo Disciplinario         | Hallazgo 8. Pago de pasivos exigibles - Vigencia expirada (D). La situación se centra en el pago de pasivos exigibles de vigencias expiradas por \$76.831.659.  |
| 4 | H-9-2024        | 1509             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 29/07/2024                    | 31/07/2026                         | Administrativo Indagación Preliminar | Pérdida de competencia para liquidación de contratos vigencias anteriores (IP). El Ministerio del Deporte perdió la competencia para liquidar 111 contratos al finalizar el año 2023, incumpliendo el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. De estos, 22 contratos con saldo a favor del Ministerio, evidenciando ineficiencias en los procesos de liquidación.                                       |
| 5 | H-15-2024       | 1515             | Adquisición de Bienes y Servicios             | 29/07/2024                    | 30/06/2025                         | Administrativo Fiscal Disciplinario  | Hallazgo 15. Debilidades en la supervisión en contratos de prestación de servicios (D, F). La CGR determina debilidades en la supervisión y ejecución de 17 contratos de prestación de servicios, objeto de la denuncia 292714- 82111-SE. Existe ausencia de algunos soportes de los pagos y los soportes existentes no permiten evidenciar el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas |
| 6 | H-16-2024       | 1516             | Fomento al Desarrollo Humano y Social         | 29/07/2024                    | 31/03/2026                         | Administrativo Fiscal Disciplinario  | Hallazgo 16. Incumplimiento del Contrato Interadministrativo 1215 de 2023 por parte de ENTERRITORIO (D, F). Se evidencia incumplimiento del Convenio Interadministrativo 1215 de 2023, por parte del contratista EnTerritorio, específicamente en la ejecución del primer pago por \$25.874.521.747 desembolsado por el Ministerio del Deporte al no  |

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                             | <b>Versión: 1</b>           |
|   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|   | <b>FORMATO</b>                             | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |
| INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO  |  |                             |

| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA           | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO   |
|---|-----------------|------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
|   |                 |                  |   |                               |                                    |                              | legalizar la documentación que soporta su ejecución  |
| 7 | H-23-2024       | 1518             | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 29/07/2024                    | 31/07/2026                         | Administrativo Disciplinario | H 23. Planeación y estructuración de estudios y diseños y recursos adicionales del convenio COID-1076 2021 y contrato de obra 362 de 2021. Apartadó. (D). En desarrollo del convenio 1076-2021, se realizó la revisión de estudios y diseños del proyecto de construcción primera etapa del centro de alto rendimiento deportivo regional de Apartadó, con varias observaciones sobre los componentes estructural, geotécnico y arquitectónico, a ser subsanadas, lo que ocasionó la necesidad de recursos adicionales y la suspensión de la etapa 2 del proyecto y de la ejecución física de las obras. |

### VIGENCIA 2025 (2)


| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO                                       | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA           | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO   |
|---|-----------------|------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | D-H1-2025       | 274              | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | 15/05/2025                    | 31/07/2026                         | Administrativo Disciplinario | Hallazgo No. 1: La Contraloría General de la República (CGR), observó debilidades en la planeación de los convenios solidarios celebrados en virtud del proceso de la Convocatoria I de Iniciativas Comunales realizada por el Ministerio del Deporte, en la vigencia 2023, lo que generó retrasos en la ejecución de 113 convenios solidarios suscritos con los Organismos de Acción Comunal (OAC). (D) |

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                             | <b>Versión: 1</b>           |
|   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|   | <b>FORMATO</b>                             | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |
| INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO  |  |                             |

| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO   | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA              | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO   |
|---|-----------------|------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| 2 | ACT-H4-25       | 284              | Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica | 15/01/2026                    | 30/04/2026                         | Administrativa<br>Disciplinario | "Hallazgo No. 04. Planeación Convenio No. COID-921-2024 (D). Por deficiencias en la planeación del Convenio No. COID-921-2024 suscrito por el Ministerio del Deporte y el Municipio de Pamplonita (Norte de Santander), la ejecución del proyecto - inicialmente prevista para 30 días - ha requerido dos prórrogas. A la fecha, el avance físico es del 15%, y la nueva fecha estimada de entrega de la cancha de fútbol es el 30 de noviembre de 2025. Esta situación se genera por deficiencias en la planeación que han afectado directamente a la comunidad beneficiaria, al retrasarse el acceso a un espacio deportivo adecuado." |

### VIGENCIA 2026 (3)

| # | CÓDIGO HALLAZGO | CÓDIGO ISOLUCION | PROCESO   | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | TIPO DE INCIDENCIA                        | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  |
|---|-----------------|------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 1 | AT-H14-25       | 285              | Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica | 30/01/2026                    | 30/04/2026                         | Beneficio de Auditoria                    | Deterioro prematuro de obras - Convenio Solidario No. 1369 del 2023 Ministerio del Deporte. - Obras vereda el Carbonero - Santander de Quilichao. |
| 2 | AT-H15-25       | 286              | Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica | 30/01/2026                    | 30/04/2026                         | Administrativo<br>Disciplinario           | Inhabilidad en la suscripción del Convenio Solidario No. 1344-2023 Ministerio del Deporte - Régimen de inhabilidades.                             |
| 3 | ACT-H9-25       | 287              | Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica | 28/02/2026                    | 30/05/2026                         | Administrativo<br>Disciplinario<br>Fiscal | Mayor valor pagado. Cancha Polideportivo Pradera Convenio Asociativo COS-1382-2023.   |

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                             | <b>Versión: 1</b>           |
|   | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA | <b>CÓDIGO:</b><br>EI-FR-006 |
|   | <b>FORMATO</b>                             | <b>Fecha:</b><br>16/07/2021 |
| INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO  |  |                             |

**4. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES REPETITIVOS: N/A**

**5. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL SEGUIMIENTO N/A**

**6. CONCLUSION(ES):**

El plan de Mejoramiento del Ministerio del Deporte, suscrito acorde a las novedades identificadas por el ente de control corresponde a un total de **546** hallazgos con su respectivo plan de mejora, de los cuales al corte 31/03/2026 se identificaron **505** cumplidos y **41** en ejecución, de los cuales se reportan en estado vencido dos (2) PM a cargo del Proceso de Fomento al Desarrollo Humano y Social (1508/2024 y 1516/2024)

Para el corte evaluado, se tiene un porcentaje de cumplimiento del **99,60%**, teniendo en cuenta que a la fecha los Planes de mejoramiento 1508/2024 y 1516/2024 no se encuentra culminados en los tiempos dispuestos por el proceso.

Para el corte evaluado, se presenta avance de ejecución del **92,49%**, correspondiente al cierre de 505 planes de mejoramiento, de un total de 546.

**7. RECOMENDACIÓN(ES) GENERAL(ES):**

Se recomienda a todos los colaboradores del Ministerio, fortalecer y aplicar los conceptos de Autocontrol y Autoevaluación, Conforme a lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, en su Artículo 2.2.21.2.2 Responsables. *“Los responsables son las autoridades y servidores públicos obligados a diseñar y aplicar métodos y procedimientos de Control Interno, de acuerdo con la Constitución y la ley, así... e. El servidor público, como eje del Sistema de Control Interno, tiene la obligación de realizar todas y cada una de sus acciones atendiendo los conceptos de autocontrol y autoevaluación, apoyando las actividades orientadas a fortalecer el funcionamiento del Sistema de Control Interno del organismo o entidad a la cual pertenece.*

En sintonía con lo anterior, se recomienda a todos los procesos de la Entidad, dar cumplimiento a las actividades planificadas por los mismos, en el tiempo y modo que determinaron, acorde a lo estipulado en la Circular Interna No 17 del 06/08/2025 con asunto: Cumplimiento y ejecución efectiva de los Planes de Mejoramiento Institucional

Presentar, de ser el caso en que aplique, las solicitudes (con argumentos) de ampliación o modificación a los planes de mejoramiento, con el objeto de poder efectuar su cierre de manera efectiva, evidenciando la subsanación de la causa raíz y que la misma no se haya vuelto a presentar posteriormente, acorde a las políticas internas del Ministerio.

Efectuar mesas de trabajo entre los Procesos y la Oficina de Control Interno del Ministerio, identificando brechas y proponiendo compromisos para la finalización de los planes de mejoramiento de manera eficaz.

*Oficio Remisorio de GESDOC firmado Por:*

Oscar Alfredo Martínez Rodríguez  
**Jefe Oficina de Control Interno**

Elaboró: Oscar Alfredo Martínez Rodríguez – Jefe Oficina de Control Interno
